



Adres

Koningin Julianaplein 58-046
2595 AA DEN HAAG

Project

304343 (JPE) - KJ Den Haag

Bouwnummer

014-07.S.17

Datum tekening

11-11-2024

Opdrachtbevestiging

1. Bouwkundig

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal	Totaalprijs
1.3.20	Standaard binnendeuren, -kozijnen en deurbeslag Alle binnendeuren, -kozijnen en het deurbeslag (garnituur) worden standaard uitgevoerd.		Definitief 11-11-2024	1	€ 0,00

3. Verwarming en ventilatie

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal
3.3.02	Lus vloerverwarming in het toilet In de afwerkvloer van het toilet wordt een lus van de vloerverwarming aangebracht. Deze zorgt ervoor dat de vloer verwarmd wordt. Deze vloerverwarming loopt mee op de vloerverwarming van de hal en kan dus niet aparte bediend worden.	Woonverdieping Toilet	Definitief 11-11-2024	2
3.3.03	Vloerverwarming als bijverwarming in de badkamer In de dekvloer van de badkamer (met uitzondering van de douchehoek en onder een eventueel optioneel ligbad) wordt vloerverwarming als bijverwarming aangebracht. Deze is enkel bedoeld om de koude uit de vloer te halen. Er wordt géén aparte bediening voor deze vloerverwarming aangebracht. Deze wordt aangesloten op de thermostaat in de woonkamer en loopt dus mee met de warmtevraag van de woonkamer. Deze vloerverwarming kan niet koelen.	Slaapverdieping Badkamer	Definitief 11-11-2024	1

5. Sanitair en tegelwerk

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal
5.0.01.014	Standaard sanitair en tegelwerk Het sanitair in de toilet en badkamer wordt aangebracht conform de technische omschrijving. Tegelwerk: Wandtegel: wit glanzend. Vloertegel: donker grijs (DAK62839). Nul-offerte: Referentienummer: 20240219. Offertedatum: 19-12-2024. Datum tekeningen: 19-12-2024. <i>Alle in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief leveren en aanbrengen. Voor de tegels is er rekening gehouden met snijverlies. De tekening is een visuele weergave. De weergegeven tegelverdeling is het uitgangspunt voor de tegelzetter. Let op: afwijkingen in de bouw kunnen invloed hebben op de tegelverdeling.</i> <i>Bijlage: 014-07S17 Warehouse 241219 Standaard</i>		Definitief 11-11-2024	1

6. Keuken


Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal
----------	---------------------	--------	-------	--------





Adres	Koningin Julianaplein 58-046 2595 AA DEN HAAG
Project	304343 (JPE) - KJ Den Haag
Bouwnummer	014-07.S.17
Datum tekening	11-11-2024

6.1.00	Standaard keuken installatiepunten	Woonverdieping	Definitief 11-11-2024
	De keukeninstallatiepunten worden conform de 0-tekening van next125/Bruynzeel Woonkamer/keuken keukens uitgevoerd.		
	<i>Memo: Keukeninstallatie nul-tekening datum: 15-10-2024.</i>		
	<i>Bijlage: 014-07S17 Keukeninstallatie nul-tekening 241015</i>		

1.3.20
Binnendeuren,
-kozijnen en deurbeslag
standaard.

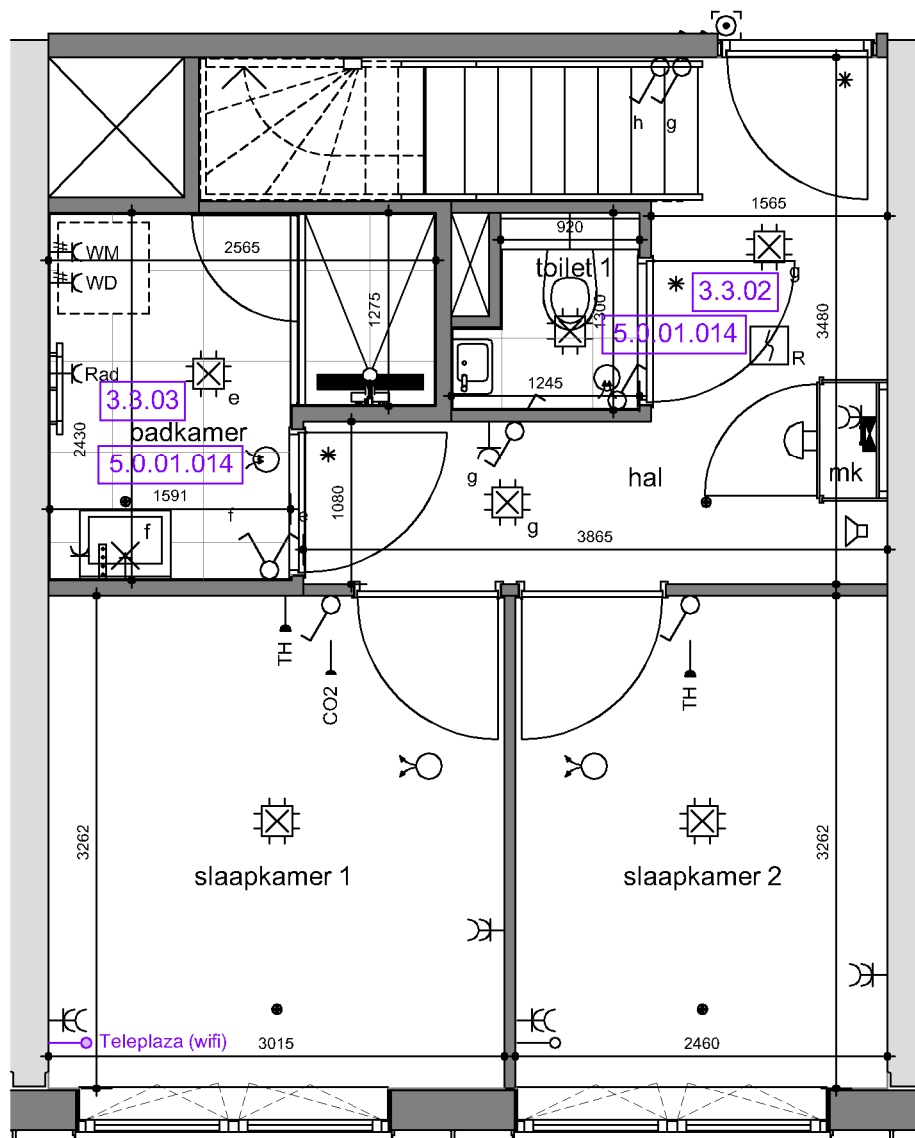

Externe berging, schaal 1:100

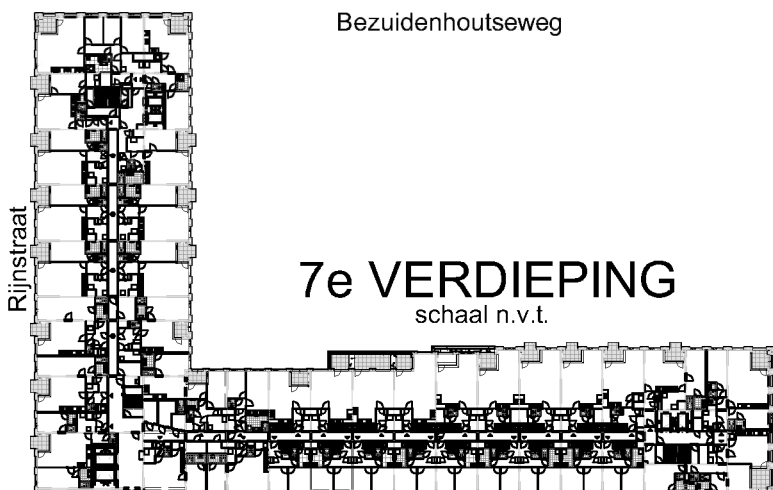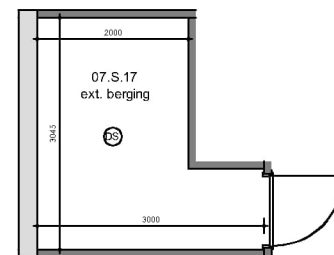

Opmerkingen:

- De aangegeven maatvoering is indicatief en in mm. De exacte maatvoering wordt bepaald in het werk.
- Definitieve posities van ventilatiepunten, lichtpunten/centraaldozen, rookmelders, sprinklers en andere installatiepunten zijn nader te bepalen en daardoor indicatief.
- Alle opties zijn onder voorbehoud. Na de sluitingsdatum vindt de (installatie-)technische controle plaats. Dit kan tot gevolg hebben dat een optie niet mogelijk is. Uiteraard informeren we je hierover.




Project:
304343 - KJ Den Haag

jp van eesteren | TBI


Bnr: 014-07.S.17

Onderwerp:
OPTIEPLATTEGROND

Schaal: 1:50
Formaat: A3



Datum tekening: 11-11-2024
Getekend: SQ
Tekeningnummer: 01

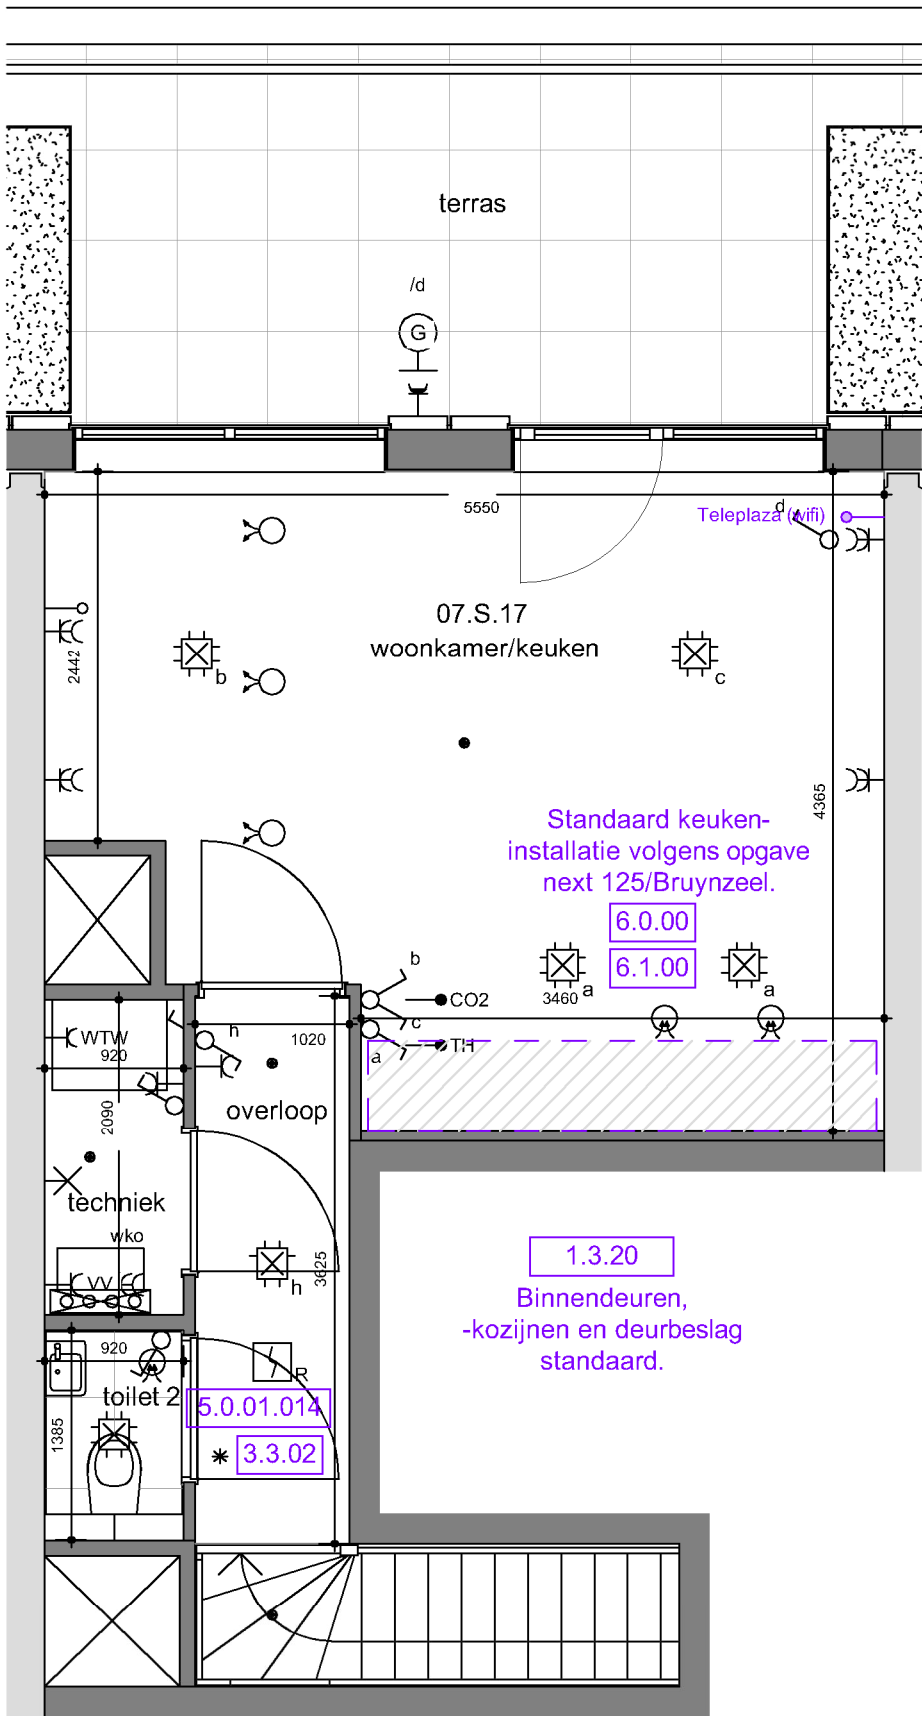


Rijnstraat

Bezuidenhoutseweg

8e VERDIEPING

schaal n.v.t.



Opmerkingen:

- De aangegeven maatvoering is indicatief en in mm. De exacte maatvoering wordt bepaald in het werk.
- Definitieve posities van ventilatiepunten, lichtpunten/centraaldozen, rookmelders, sprinklers en andere installatiepunten zijn nader te bepalen en daardoor indicatief.
- Alle opties zijn onder voorbehoud. Na de sluitingsdatum vindt de (installatie-)technische controle plaats. Dit kan tot gevolg hebben dat een optie niet mogelijk is. Ultraard informeren we je hierover.



Project:
304343 - KJ Den Haag

jp van eesteren | TBI

Bnr:

014-07.S.17

Onderwerp:

OPTIEPLATTEGROND

Schaal:

1:50

Formaat:

A3

Datum tekening:

11-11-2024

Getekend:

SQ

Tekeningnummer:

02



Offerte

- Ontwikkelcombinatie KJ
Koningin Julianaplein
'S-GRAVENHAGE

Referentienummer: 20240219
Datum: 19 december 2024
Adviseur: Elise van der Hoog
Telefoon klant: -
Email: kj@thewarehouse.nl
Project: KJ Den Haag
Bouwnummer: 014-07.S.17

Ontwikkelcombinatie KJ,

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de Warehouse! Met plezier bieden wij onderstaand uw gemaakte keuzes aan.

Sanitaire artikelen

code	omschrijving	aantal	bedrag
Badkamer			
Douche-opstelling bestaande uit:			
1295489	Easydrain Multi fixt-1 rooster 70cm geborsteld rvs EDF700	1 st	
			
1295481	Easydrain Multi inbouwdeel drain 70cm zonder rooster zij uitl. rvs EDM1700	1 st	
			
1287384	Easydrain bebandingsset voor multi en fixt 50 t/m 120cm EDB-03	1 st	
			
1786204	Hansgrohe Vernis showerpipe met thermostaat ecosmart chroom 26089000	1 st	
			

code	omschrijving	aantal	bedrag
1992599	Novellini Giada g+f deur+wand in lijn 120 li 120-126cm held.m.chr GIADNGF120S-1B	1 st	



1888813	Novellini Louvre muursteun 450mm chroom R80LOU450-K	1 st	
---------	---	------	--

1588974	Wastafel-opstelling bestaande uit: Duravit Vero Air meubelwastafel 60x47cm m/1 kraangat m/overloop wit 2350600000	1 st	
---------	--	------	--



1057590	De Beer Schallfix wastafelbevestigingsset met plug m10x110mm 215109001	1 st	
---------	---	------	--



1302452	Hansgrohe Metris wastafelkraan 110 lowflow met waste chroom 31203000	1 st	
---------	--	------	--



1301399	Grohe hoekstopkraan 1/2"x3/8" knel chroom 22018000	2 st	
---------	--	------	--




1071432	Hansgrohe Flowstar s premium designsifon chroom 52105000	1 st	
---------	--	------	--




1075880	De Beer rubber manchet pvc / metaal 40x32mm zwart 112340001	1 st	
---------	---	------	--



code	omschrijving	aantal	bedrag
1286926	Lavigo Square spiegel rechthoekig 50x80cm	1 st	



1565173	Lavigo M-line spiegelbevestigingsset tot 0,5m2	1 st	
---------	--	------	--



1501049	Radiator Zehnder Aura radiator el. 500x1226mm 750w verkeerswit ral 9016 PBEZ-120-50/MQ	1 st	
---------	---	------	--



Toiletruimte 7e verdieping

1838906	Toilet-opstelling bestaande uit: Duravit D-Neo pack wandcloset verkort 48cm rimless wit 45880900A1	1 st	
---------	--	------	--



1042129	Geberit Sigma 01 bedieningsplaat 2 toets wit 115.770.11.5	1 st	
---------	---	------	--



1588769	Fontein-opstelling bestaande uit: Duravit DuraStyle fontein 36x22cm 1 kraangat rechts z/overloop wit 0713360000	1 st	
---------	--	------	--



1287940	Grohe Universal fonteinkraan met u uitloop chroom 20202000	1 st	
---------	--	------	--



code	omschrijving	aantal	bedrag
1580884	Schell aansluitbuisje 10mmx300mm kraag 1/2'en 3/8' chroom 500000699	1 st	
			
1301399	Grohe hoekstopkraan 1/2'x3/8' knel chroom 22018000	1 st	
			
1071338	Hansgrohe afvoerplug 1 1/4' niet afsluitbaar chroom 50001000	1 st	
			
1071432	Hansgrohe Flowstar s premium designsifon chroom 52105000	1 st	
			
1075880	De Beer rubber manchet pvc / metaal 40x32mm zwart 112340001	1 st	
			

Toiletruimte 8e verdieping

Toilet-opstelling bestaande uit:

1838906 Duravit D-Neo pack wandcloset verkort 48cm rimless wit 45880900A1 1 st



1042129 Geberit Sigma 01 bedieningsplaat 2 toets wit 115.770.11.5 1 st



Fontein-opstelling bestaande uit:

code	omschrijving	aantal	bedrag
1588769	Duravit DuraStyle fontein 36x22cm 1 kraangat rechts z/overloop wit 0713360000	1 st	



1287940	Grohe Universal fonteinkraan met u uitloop chroom 20202000	1 st	
---------	--	------	--



1580884	Schell aansluitbuisje 10mmx300mm kraag 1/2'en 3/8' chroom 500000699	1 st	
---------	---	------	--



1301399	Grohe hoekstopkraan 1/2'x3/8' knel chroom 22018000	1 st	
---------	--	------	--



1071338	Hansgrohe afvoerplug 1 1/4' niet afsluitbaar chroom 50001000	1 st	
---------	--	------	--



1071432	Hansgrohe Flowstar s premium designsifon chroom 52105000	1 st	
---------	--	------	--



1075880	De Beer rubber manchet pvc / metaal 40x32mm zwart 112340001	1 st	
---------	---	------	--



Tegels

code	omschrijving	aantal	prijs per eenheid	bedrag
Badkamer				
1007381	Branco 20 x 50 cm Uni vlak glans Vlak	32.4 m ²		
2040081	Dark grey 59.8 x 59.8 cm Uni vlak mat Vlak	7.14 m ²		
1027058	Schiene Roestvast staal	1 st		
1020517	Dorpels Antraciet	1 st		
1020517	Dorpels Antraciet	1 st		
	Retourbedrag	1		
Toiletruimte 7e verdieping				
1007381	Branco 20 x 50 cm Uni vlak glans Vlak	6 m ²		
2040081	Dark grey 59.8 x 59.8 cm Uni vlak mat Vlak	2.86 m ²		
1027058	Schiene Roestvast staal	1 st		
1020517	Dorpels Antraciet	1 st		
	Retourbedrag	1		
Toiletruimte 8e verdieping				
1007381	Branco 20 x 50 cm Uni vlak glans Vlak	6 m ²		
2040081	Dark grey 59.8 x 59.8 cm Uni vlak mat Vlak	2.86 m ²		
1085698	Schiene Roestvast staal	1 st		
1020517	Dorpels Antraciet	1 st		
	Retourbedrag	1		

Arbeid / Montage

omschrijving	aantal	prijs per eenheid	bedrag
Badkamer			
Aanbrengen standaard wandtegel 20 x 50 cm per m2	24.32		
(st) Aanbrengen gerectificeerde vloertegel incl. levellingsysteem 60 x 60 cm per m2	4.93		
(st) Aanbrengen RVS hoekprofiel	2.67		
(st) Aanbrengen kimaafdichting	13.50		
(st) Integelen easydrain	1		
(st) Vloer smeren douchehoek	1		
Holonite dorpels lijmen 1000x100x20 mm	2		
Toiletruimte 7e verdieping, arbeid tegels:			
Aanbrengen standaard wandtegel 20 x 50 cm per m2	4.5		
(st) Aanbrengen gerectificeerde vloertegel incl. levellingsysteem 60 x 60 cm per m2	1.19		
(st) Aanbrengen RVS hoekprofiel	2.10		
(st) Vrijhangend toilet aantegelen	1		
Holonite dorpels lijmen 1000x100x20 mm	1		
Toiletruimte 8e verdieping, arbeid tegels			
Aanbrengen standaard wandtegel 20 x 50 cm per m2	4		
(st) Aanbrengen gerectificeerde vloertegel incl. levellingsysteem 60 x 60 cm per m2	1.10		
(st) Aanbrengen RVS hoekprofiel	0.92		
(st) Vrijhangend toilet aantegelen	1		
Holonite dorpels lijmen 1000x100x20 mm	1		

Totaal retour montage tegelwerk badkamer en toiletruimte

Verwerking

Badkamer:

Wandtegel: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken tot plafond, voeg zilvergrijs.

Vloertegel: Rako Abetone DAK62839 dark grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.

Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.

Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.

** alle uitwendige hoeken**

Douchevloer op afschot met: Dorpel Holonite antraciet.

Deurdorpel: Holonite antraciet.

In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

Toiletruimte 7e verdieping:

Wandtegel: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken tot 120 cm, voeg zilvergrijs.

Vloertegel: Rako Abetone DAK62839 dark grey 60 x 60 cm (standaard) (rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.

Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.

Bovenzijde van wandtegelwerk: wordt standaard niet afgewerkt.

Wandafwerking boven wandtegelwerk: volgens T.O. (technische omschrijving).

Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.

** uitwendige hoek inbouwreservoir **

** uitwendige hoek schachtelement tot circa 120 cm. **

Deurdorpel: Holonite antraciet.

In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

Toiletruimte 8e verdieping:

Wandtegel: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken tot 120 cm, voeg zilvergrijs.

Vloertegel: Rako Abetone DAK62839 dark grey 60 x 60 cm (standaard) (rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.

Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.

Bovenzijde van wandtegelwerk: wordt standaard niet afgewerkt.

Wandafwerking boven wandtegelwerk: volgens T.O. (technische omschrijving).

Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.

** uitwendige hoek inbouwreservoir **

Deurdorpel: Holonite antraciet.

In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.


0011 - bouwnummer 014-07.S.17 badkamer

Renvooi


	Enkele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Dubbele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Enkele WCD ca. 1050 mm +VL
	Dubbele WCD vert. ca. 1050 mm +VL
	Dubbele WCD hor. ca. 1050 mm +VL
	Radiator WCD ca. 300 mm +VL
	Aardingspunt (indicatief)
	Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL
	Lichtpunt plafond (indicatief)
	Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)
	Thermostaat bediening radiator
	Radiator vaste aansluiting ca. 300 mm +VL
	Kozijn zonder bovenlicht

 Sprinklerkop

maatvoering deur is inclusief kozijn.

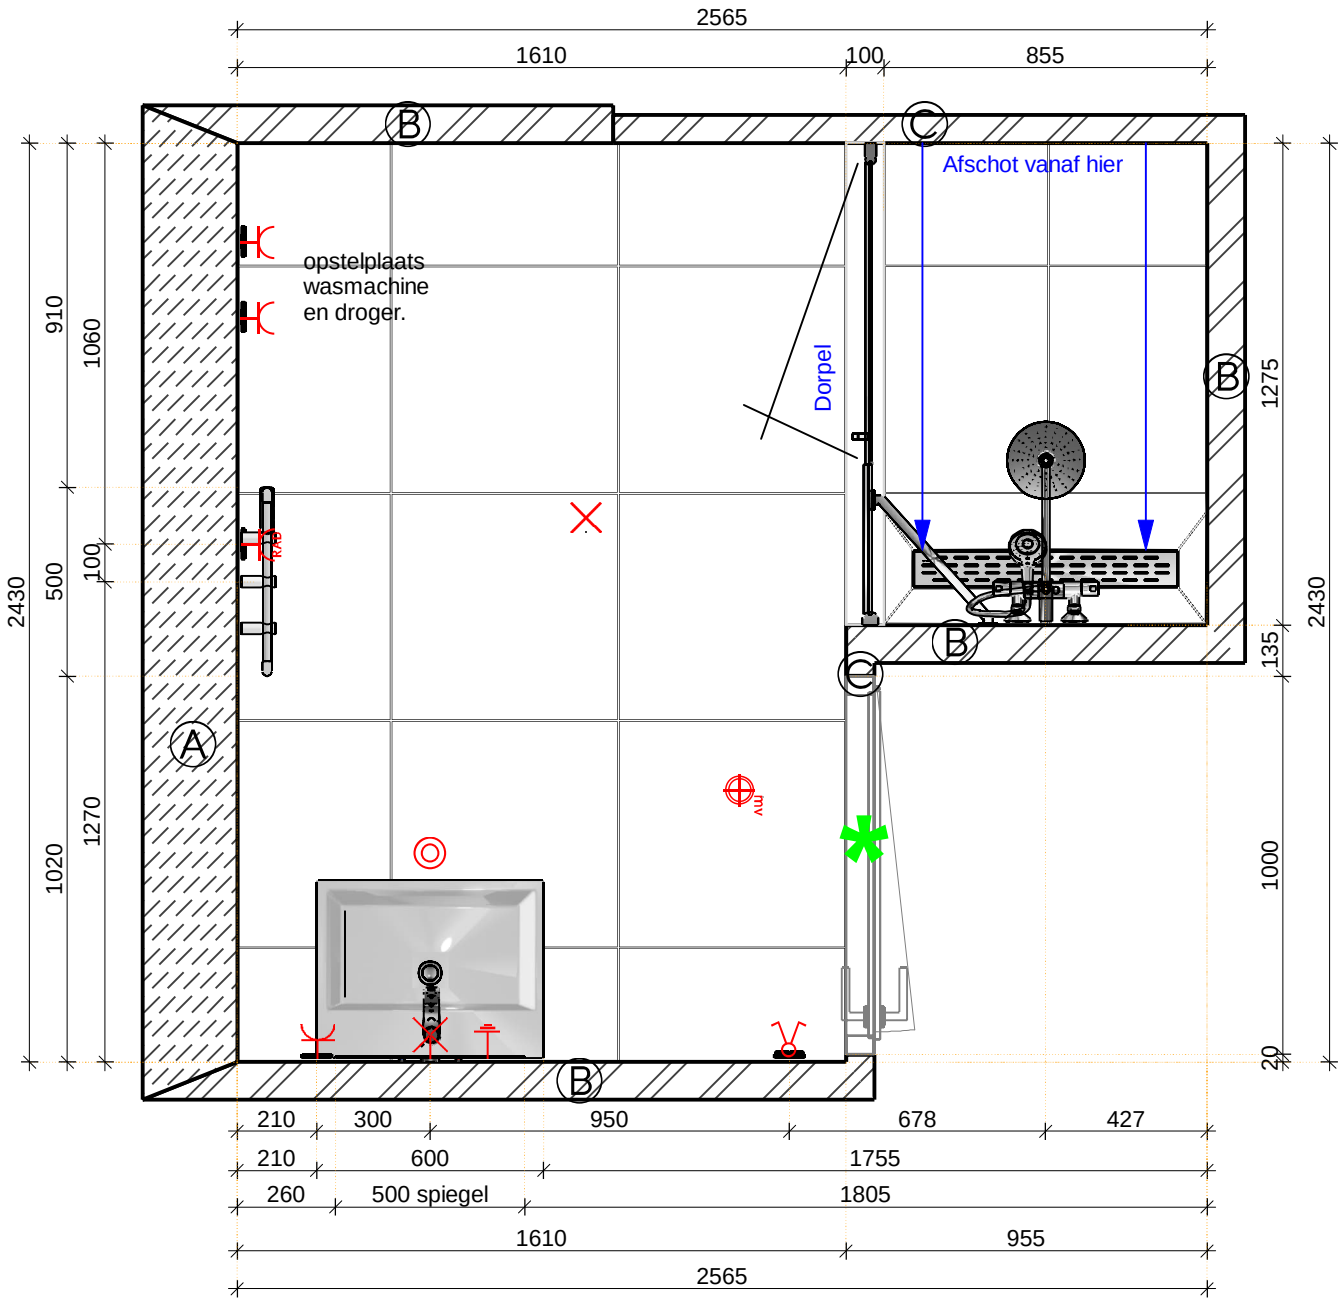

Standaard afvoer/toevoer wastafel

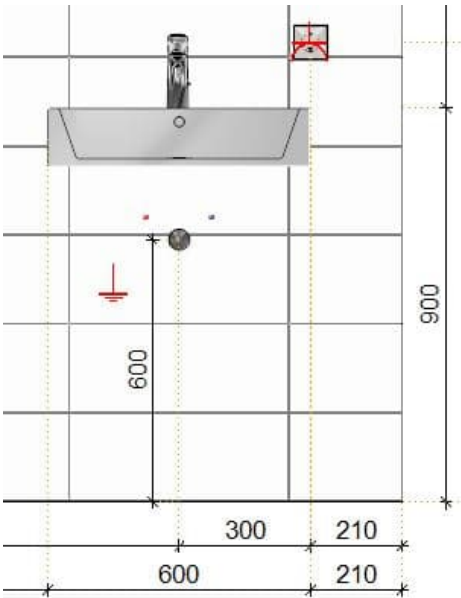

Badkamer:

Wandtegel: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken tot plafond, voeg zilvergrijs.
Vloertegel: Rako Abetone DAK62839 dark grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
** alle uitwendige hoeken**
Douchevloer op afschot met: Dorpel Holonite antraciet.
Deurdorpel: Holonite antraciet.
In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

Verdiepingshoogte ca. 2670 mm

- A: Betonwand
B: Metal stud 100
C: Metal stud 75

- 1: Douchevloer op afschot
2: Hoogte hart(maat) douchekraan ca. 1100 mm +VL
3: Hoogte onderzijde regendouche(kop) ca. 2096 mm +VL
4: Hoogte bovenzijde wastafel ca. 900 mm +VL
5: Hoogte bovenzijde spiegel ca. 2000 mm +VL
6: Hoogte onderzijde elektrische radiator (excl. bediening) ca. 400 mm +VL

WAREHOUSE
framing your future

De genoemde maatvoering is excl. tegelwerk. De tekening is een visuele weergave van uw badkamer/toilet. De weergegeven tegelverdeling is het uitgangspunt voor de tegelzetter. Let op: kleine afwijkingen in de bouw kunnen invloed hebben op de tegelverdeling.



Project.:	KJ Den Haag
Bouwnummer:	014-07.S.17
Stad.:	Den Haag
Datum: 19-12-2024	

Afbeelding badkamer




0011 - bouwnummer 014-07.S.17 Toiletruimte 7e verdieping


Renvooi

	Enkele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Dubbele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL
	Lichtpunt plafond (indicatief)
	Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)
	Vaste aansluiting ca. 300 mm +VL
	Kozijn zonder bovenlicht

maatvoering deur is inclusief kozijn

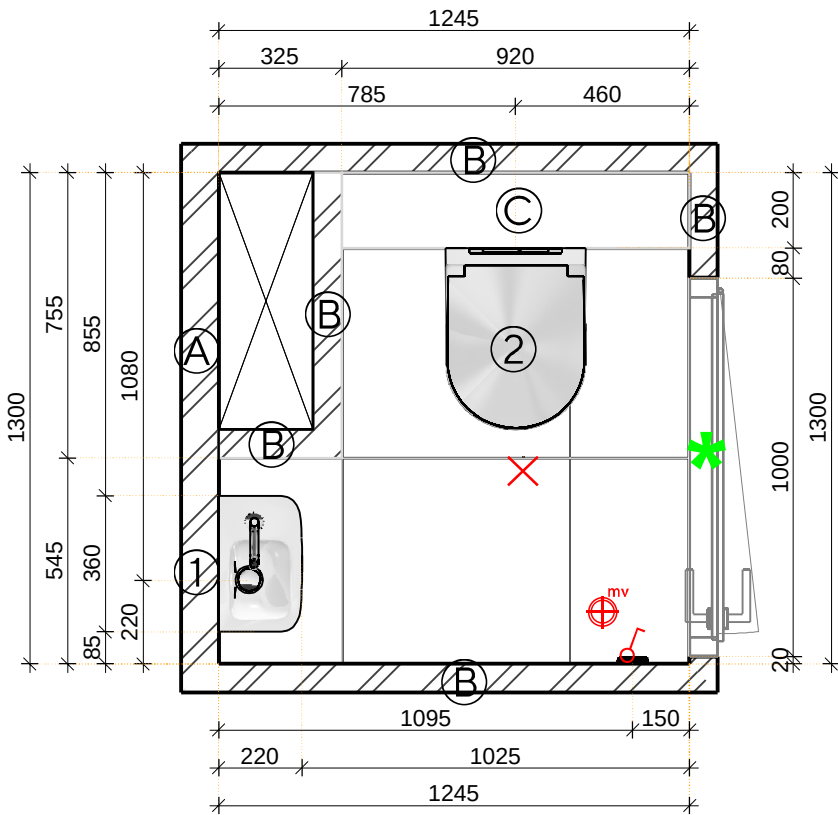

Standaard afvoer/toevoer fontein



Toiletruimte 7e verdieping:

Wandtegels: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken tot 120 cm, voeg zilvergrijs.
Vloertegel: Rako Abetone DAK62839 dark grey 60 x 60 cm (standaard) (rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Bovenzijde van wandtegels: wordt standaard niet afgewerkt.
Wandafwerking boven wandtegels: volgens T.O. (technische omschrijving).
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
** uitwendige hoek inbouwreservoir **
** uitwendige hoek schachtelement tot circa 120 cm.**
Deurdeur: Holonite antraciet.
In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

Verdiepingshoogte ca. 2670 mm

- A: Metal stud 100
- B: Metal stud 75
- C: Hoogte bovenzijde inbouwreservoir ca. 1180 mm +VL


- 1: Hoogte bovenzijde fontein ca. 900 mm +VL
- 2: Hoogte bovenzijde wandcloset (excl. zitting) ca. 430 mm +VL




Renvooi

	Enkele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Dubbele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL
	Lichtpunt plafond (indicatief)
	Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)
	Vaste aansluiting ca. 300 mm +VL
	Kozijn zonder bovenlicht

maatvoering deur is inclusief kozijn

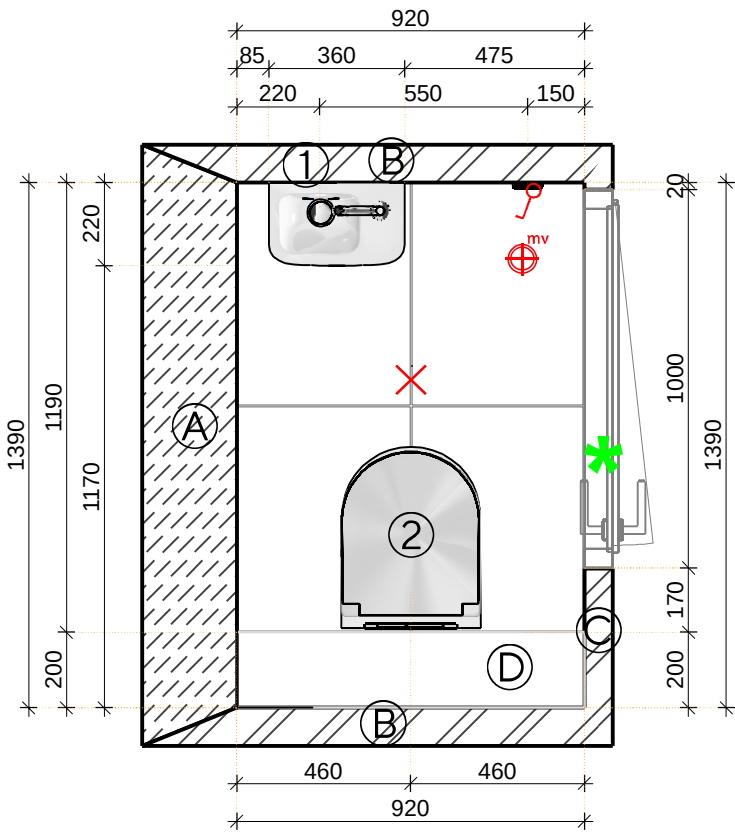

Standaard afvoer/toevoer fontein

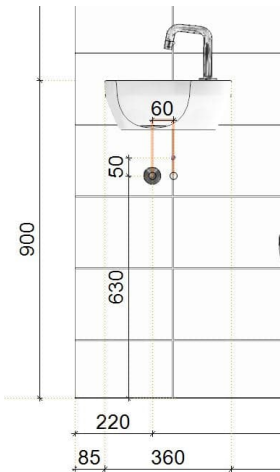


Verdiepingshoogte ca. 2670 mm

- A: Betonwand
- B: Metal stud 100
- C: Metal stud 75
- D: Hoogte bovenzijde inbouwreservoir ca. 1180 mm +VL

- 1: Hoogte bovenzijde fontein ca. 900 mm +VL
- 2: Hoogte bovenzijde wandcloset (excl. zitting) ca. 430 mm +VL


Toiletruimte 8e verdieping:

Wandtegels: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken tot 120 cm, voeg zilvergrijs.
Vloertegel: Rako Abetone DAK62839 dark grey 60 x 60 cm (standaard) (rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Bovenzijde van wandtegels: wordt standaard niet afgewerkt.
Wandafwerking boven wandtegels: volgens T.O. (technische omschrijving).
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
** uitwendige hoek inbouwreservoir **
Deurdorpel: Holonite antraciet.
In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

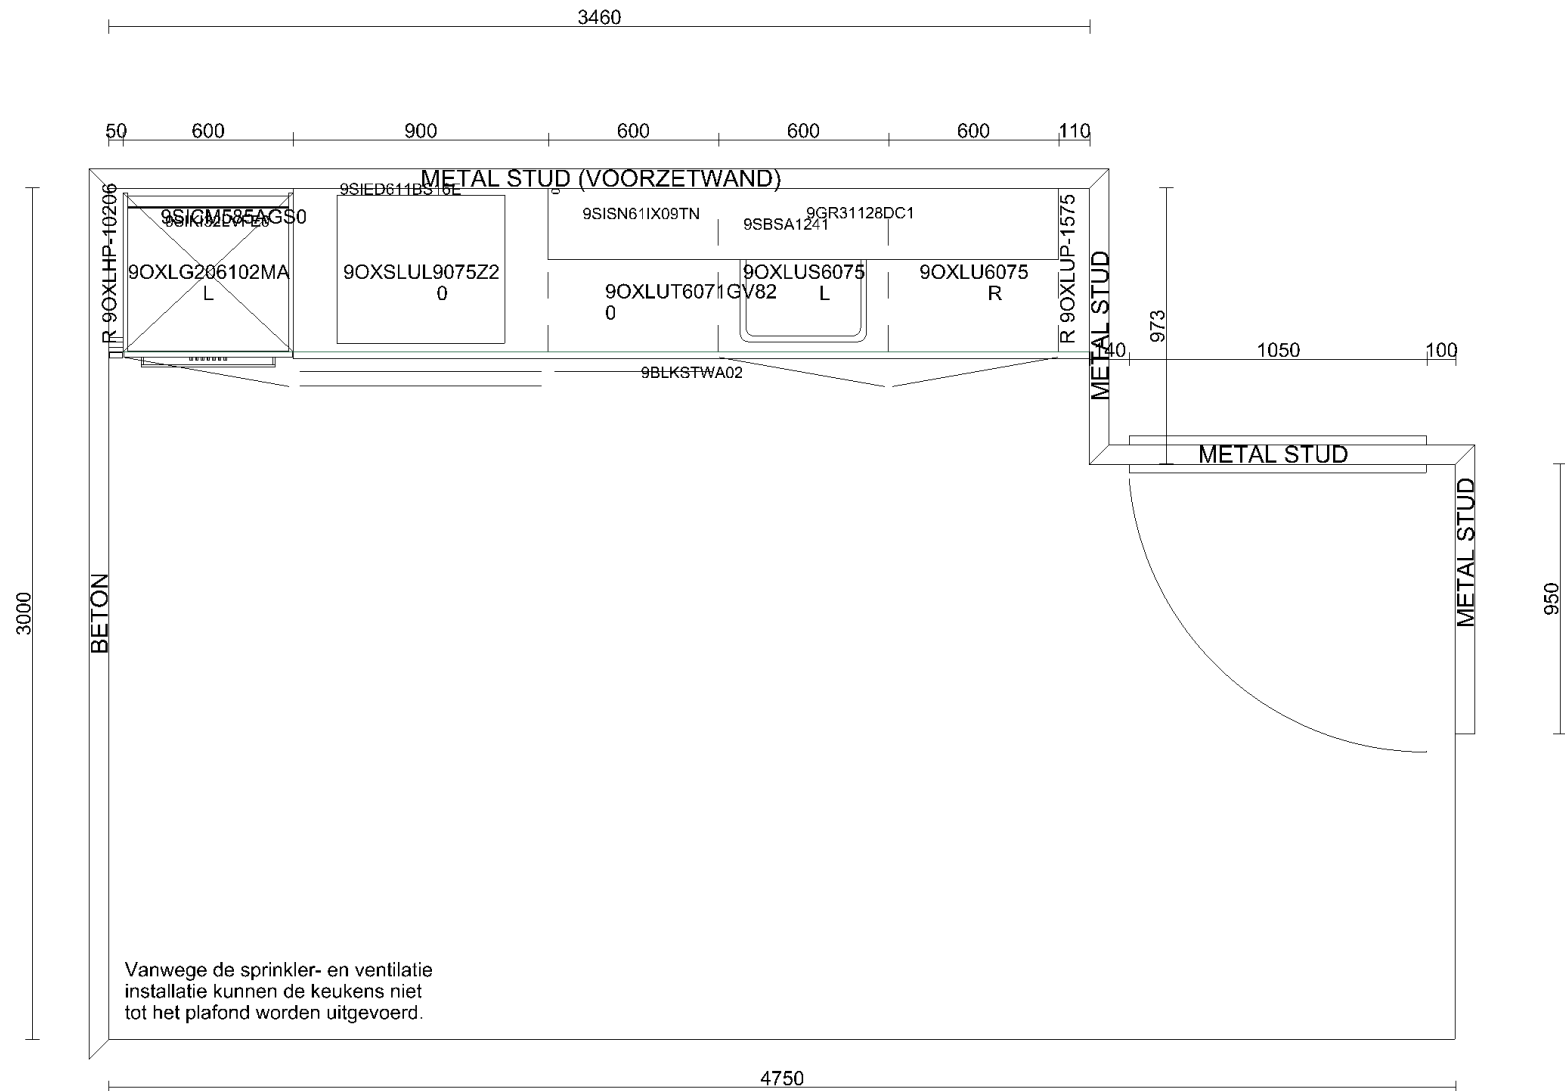


Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	15-10-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.32	Leveradres	Opstelling Bnr. 014-07.S.17 / Recht Lange Poten	Versie	RTH 151024
Tekening	Bovenaanzicht	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

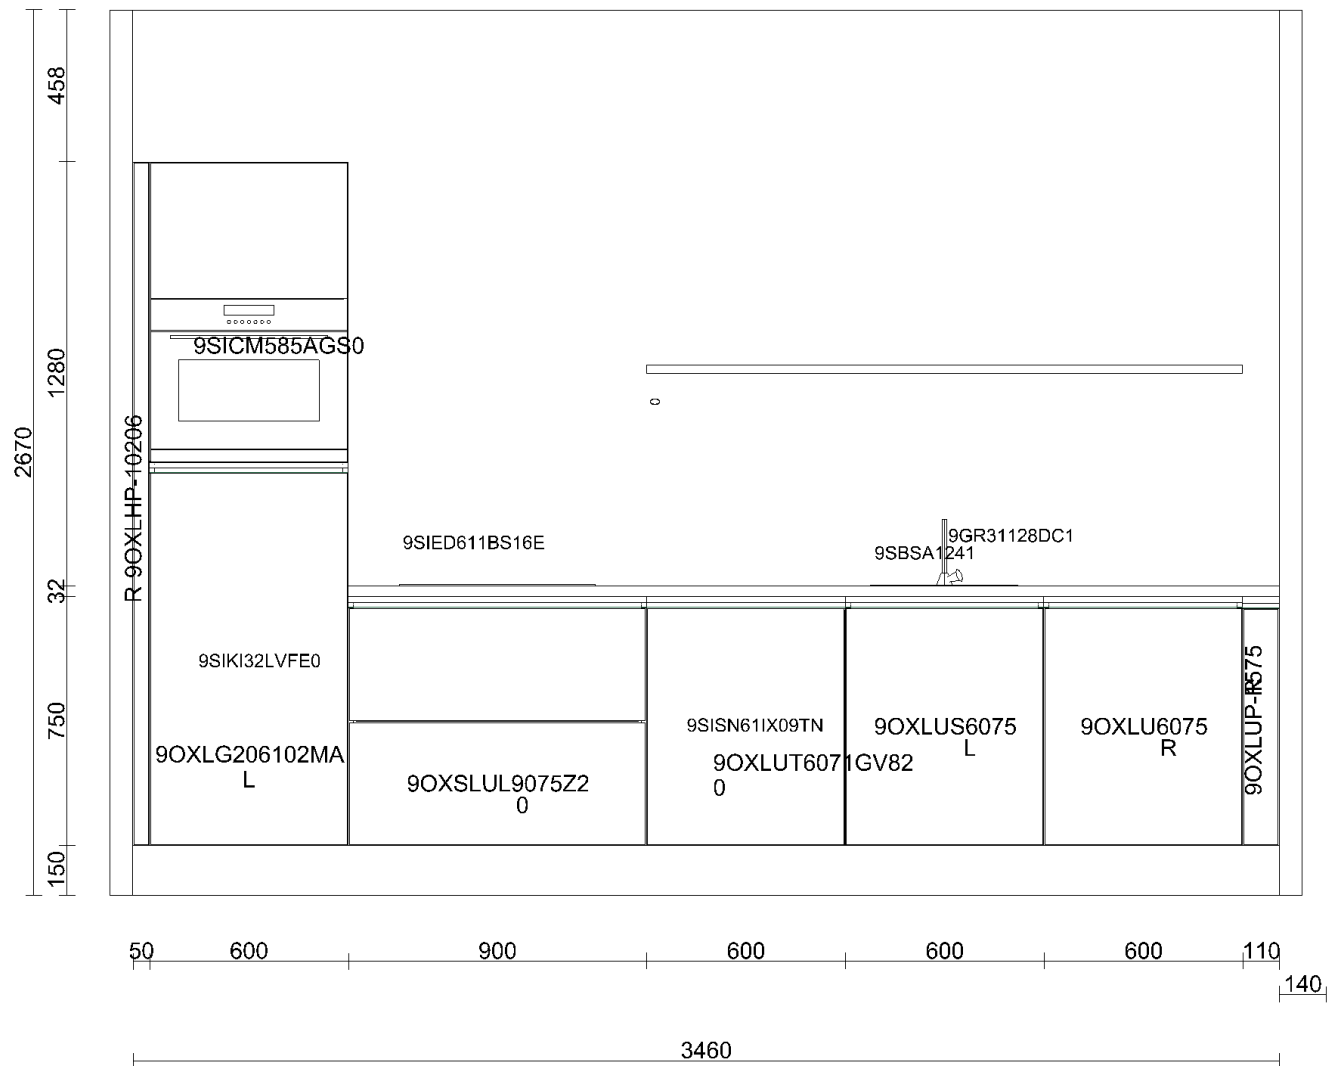

Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	15-10-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.32	Leveradres	Opstelling Bnr. 014-07.S.17 / Recht Lange Poten	Versie	RTH 151024
Tekening	Wandaanzicht 1	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

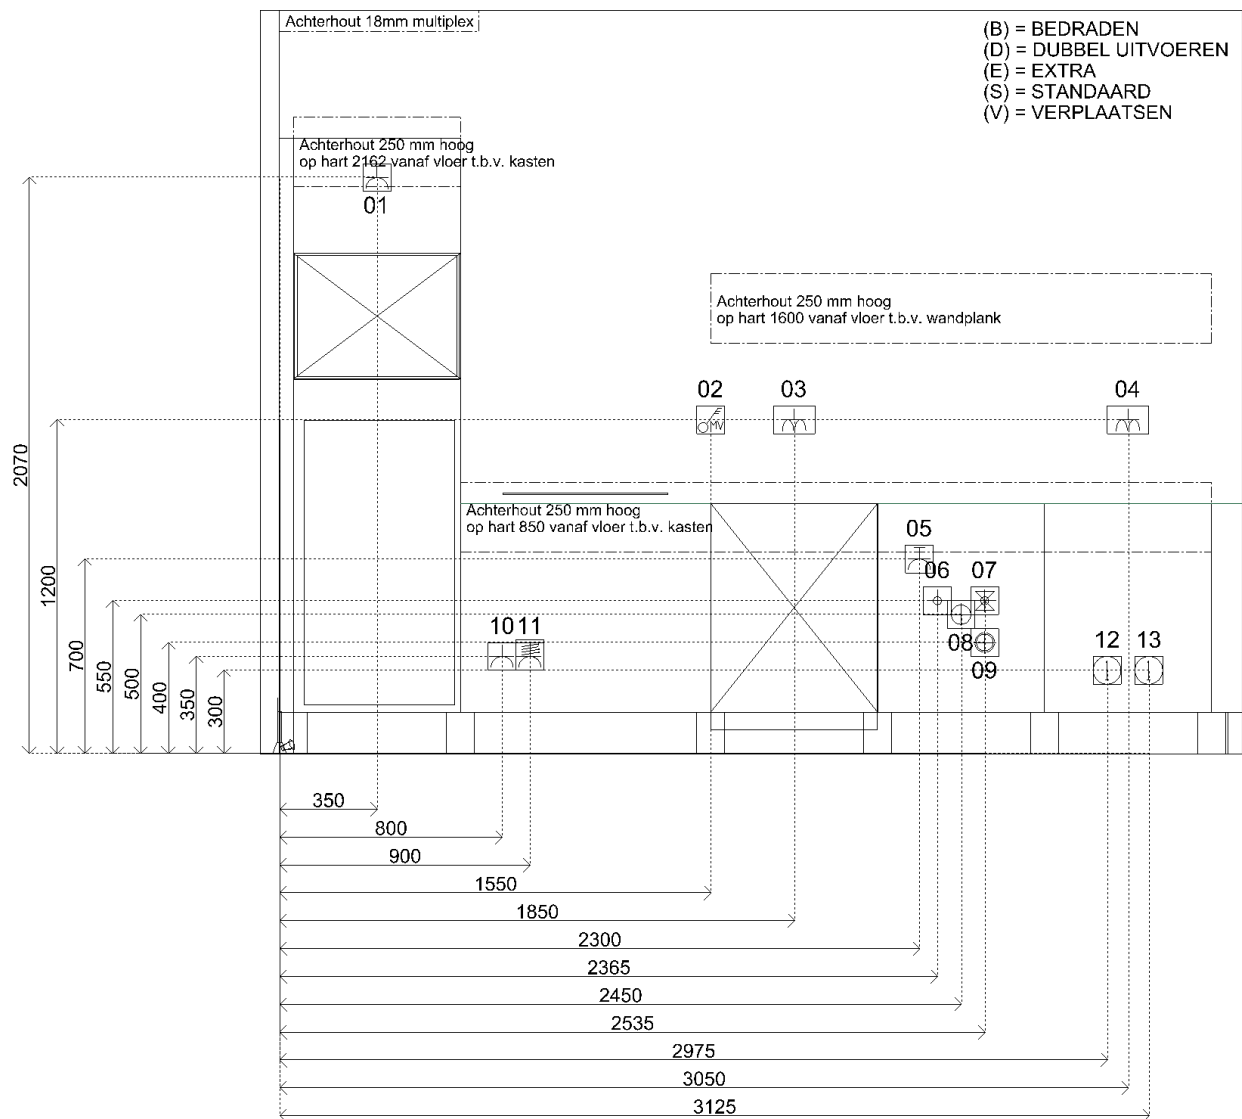


Sym	Detail
01	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. (combi)oven á 3,6 kW
02	(S) Schakelaar MV
03	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
04	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
05	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. vaatwasser á 2,2 kW
06	(S) Warmwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
07	(S) Koudwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
08	(S) Afvoer 40mm opbouw vanuit vloer t.b.v. spoelbak en vaatwasser
09	(S) Combikraan (kw) met beluchter en terugslagklep t.b.v. vaatwasser
10	(S) E-WCD+ra t.b.v. koelkast
11	(S) 2 fasen perilex t.b.v. inductie kookplaat á 7,4 kW
12	(S) Loze leiding
13	(S) Loze leiding
14	(S) Thermostaat
15	(S) CO2 sensor
16	(S) Enkelpolige schakelaar
17	(S) Wisselschakelaar
18	(S) D-WCD+ra verticaal t.b.v. algemeen gebruik



Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	15-10-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.32	Leveradres	Opstelling Bnr. 014-07.S.17 / Recht Lange Poten	Versie	RTH 151024
Tekening	Installatietekening wand 1	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

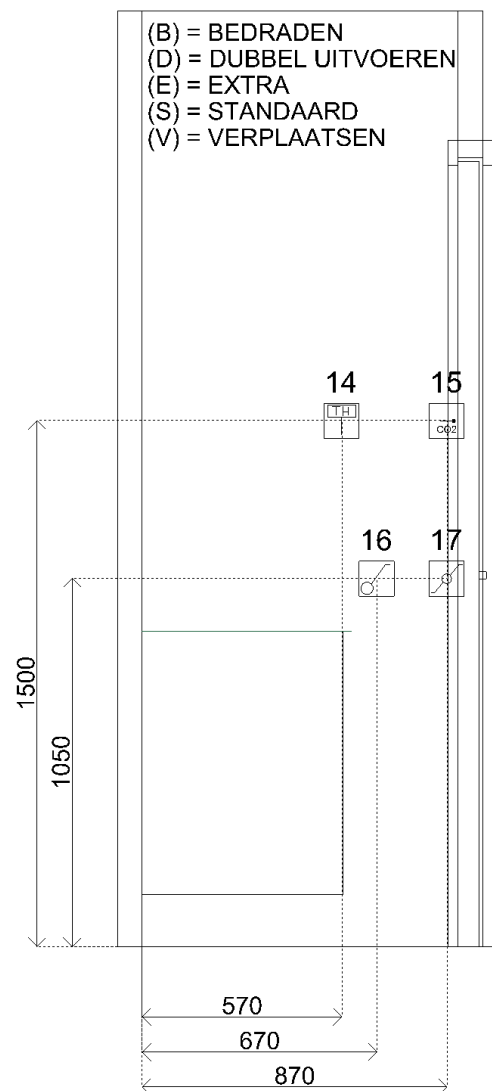


Sym	Detail
01	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. (combi)oven á 3,6 kW
02	(S) Schakelaar MV
03	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
04	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
05	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. vaatwasser á 2,2 kW
06	(S) Warmwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
07	(S) Koudwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
08	(S) Afvoer 40mm opbouw vanuit vloer t.b.v. spoelbak en vaatwasser
09	(S) Combikraan (kw) met beluchter en terugslagklep t.b.v. vaatwasser
10	(S) E-WCD+ra t.b.v. koelkast
11	(S) 2 fasen perilex t.b.v. inductie kookplaat á 7,4 kW
12	(S) Loze leiding
13	(S) Loze leiding
14	(S) Thermostaat
15	(S) CO2 sensor
16	(S) Enkelpolige schakelaar
17	(S) Wisselschakelaar
18	(S) D-WCD+ra verticaal t.b.v. algemeen gebruik



Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	15-10-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.32	Leveradres	Opstelling Bnr. 014-07.S.17 / Recht Lange Poten	Versie	RTH 151024
Tekening	Installatietekening wand 2	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

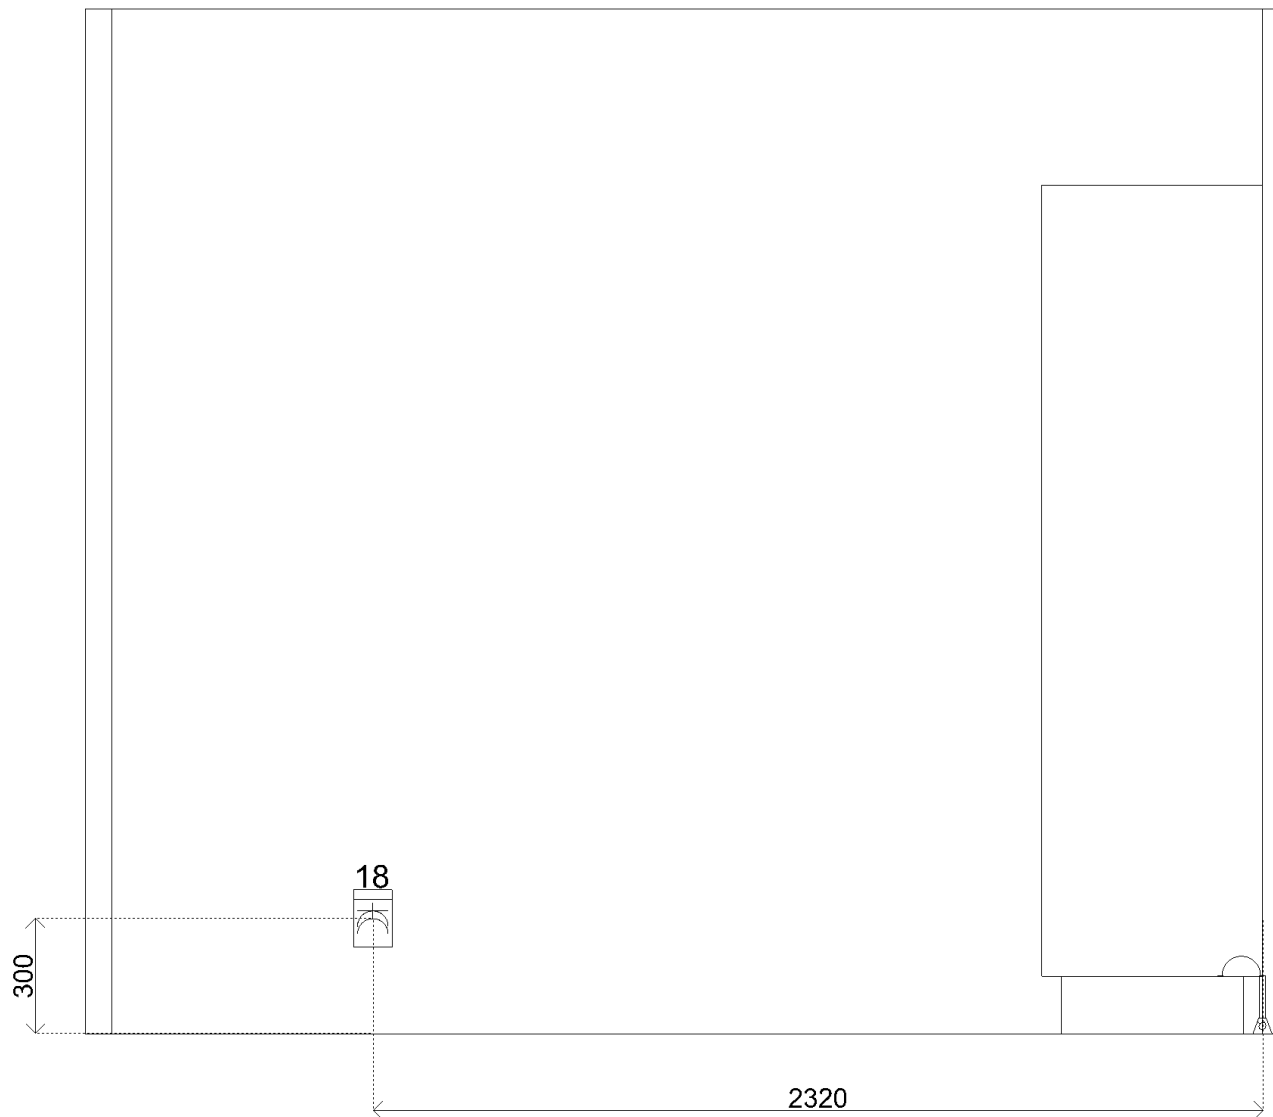

Sym	Detail
01	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. (combi)oven á 3,6 kW
02	(S) Schakelaar MV
03	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
04	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
05	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. vaatwasser á 2,2 kW
06	(S) Warmwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
07	(S) Koudwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
08	(S) Afvoer 40mm opbouw vanuit vloer t.b.v. spoelbak en vaatwasser
09	(S) Combikraan (kw) met beluchter en terugslagklep t.b.v. vaatwasser
10	(S) E-WCD+ra t.b.v. koelkast
11	(S) 2 fasen perilex t.b.v. inductie kookplaat á 7,4 kW
12	(S) Loze leiding
13	(S) Loze leiding
14	(S) Thermostaat
15	(S) CO2 sensor
16	(S) Enkelpolige schakelaar
17	(S) Wisselschakelaar
18	(S) D-WCD+ra verticaal t.b.v. algemeen gebruik



Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	15-10-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.32	Leveradres	Opstelling Bnr. 014-07.S.17 / Recht Lange Poten	Versie	RTH 151024
Tekening	Installatietekening wand 6	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	15-10-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.32	Leveradres	Opstelling Bnr. 014-07.S.17 / Recht Lange Poten	Versie	RTH 151024
Tekening	Rendering 1	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
